

Druckprüfung DIN EN1610 Luft

Auftraggeber : Stein
 :
 :
 Straße : Derkerborn 38
 Ort : 59929 Brilon
 Telefon :
 Fax :

Auftragnehmer : Rohrreinigung Stein
 :
 :
 Straße : Derkerborn 38
 Ort : 59929 Brilon
 Telefon : 02961/50267
 Fax : 02961/52769

Prüfdatum : 31.10.2011 Auftrag : 1
 Anwesende : Stein & Kaupmann
 Kommentar :

Auftragsdatum : 15.09.2011

Bezeichnung : Von KM 4200
 : bis KM 4210
 :
 Ort : Brilon
 Straße : Derkerborn 38
 Entwässerungssystem : Mischwasser

Leitungsnetzdaten s. 2. Seite

Prüfmaterial : PVC
 Prüfdruck : 54,4 mbar
 Prüfzeit : 244 s

Prüfverfahren : DIN LB
 Beruhigungszeit : 324 s
 Vorfülldruck : 55 mbar


Bauteil (Nr.) : 1
 Bauteil : Grundleitung

Anfangsdruck : 54,4 mbar
 Enddruck : 53,6 mbar

Druckprüfung nach DIN EN 1610 bestanden.

Prüfer :

Unterschrift :

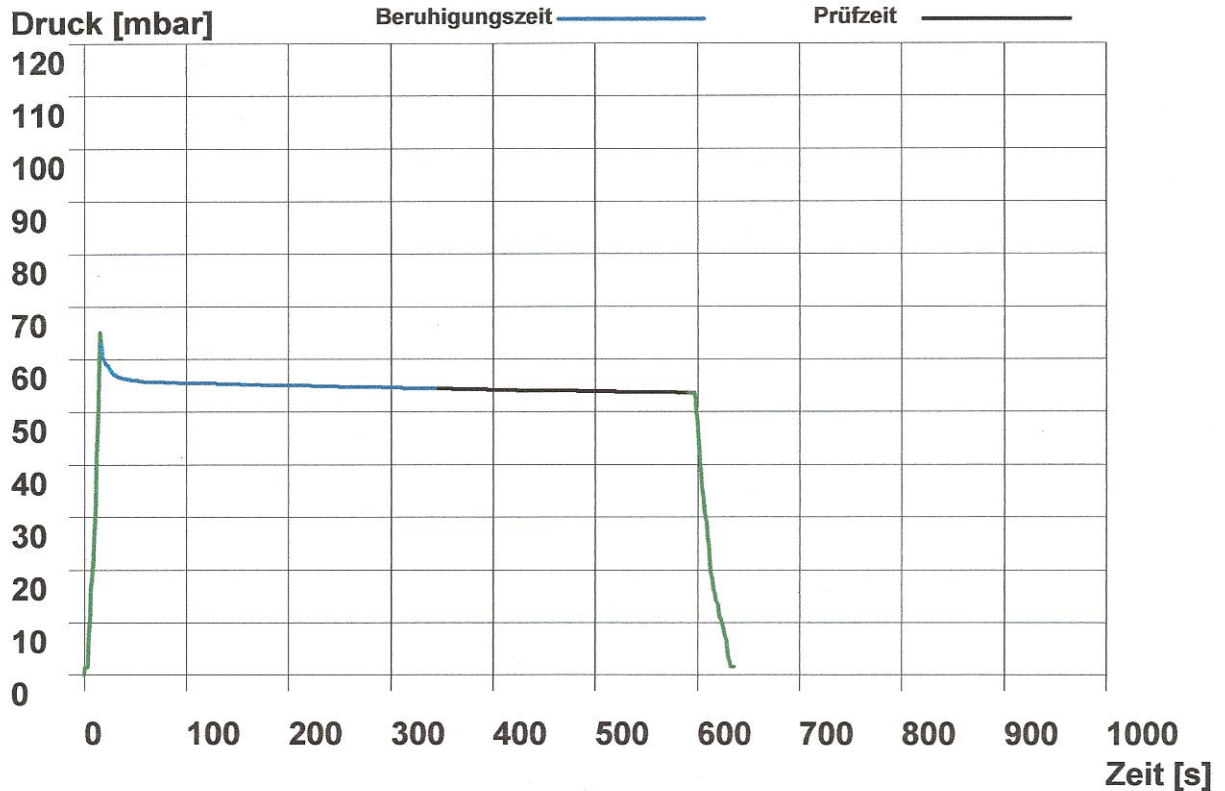

Ort : Brilon
Straße : Derkerborn 38
Leitungsnetz : Von KM 4200
: bis KM 4210
:

Durchmesser : 100 mm **Länge** : 25.00 m
